

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2019
TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN,
 PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y
 MANTENIMIENTO.

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ
 DOMICILIO CALLE 11 S/N ENTRE 22 Y 28 CHINÁ CAMPECHE C.P. 24520
 COMPLETO _____

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL
 CONTRATADA

FECHA DE INICIO

23	3	2015
DÍA	MES	AÑO

 FECHA DE TERMINACIÓN

19	8	2016
DÍA	MES	AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA

10	6	2019
DÍA	MES	AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media y Superior 2015 (ProExOEEES 2015)	Construcción de la 2da. Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo I	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	100%	8,500,000.00	1,087	1,214	100%	Se anexa Tarjeta Informativa enviada con oficio No INIFEEC/CA/095/2019 por el INIFEEC con el Desglose de los Recursos recibidos, ecutados y devueltos a la TESOFE-ProExOEEES 2014 y 2015-INIFEEC



COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE : MDE. MARÍA ESTHER COHUO ÁVILA
 CARGO : JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRONICO : pl.china@tecnm.mx / pameltechina@gmail.com
 TEL 10 DÍGITOS : 9961020051

FIRMA

NOMBRE : VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
MC. JOSÉ JAVIER PERALTA COSGAYA
 FIRMA

S.E.P.
 T.N.M
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE CHINA
 CLAVE:
04DIT0002W

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROEXO(E)PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019


TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL.
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Edificio de Unidad Académica Departamental Tipo I, Vista de Frente Panoramico (Finalizado y Puesta a Punto)

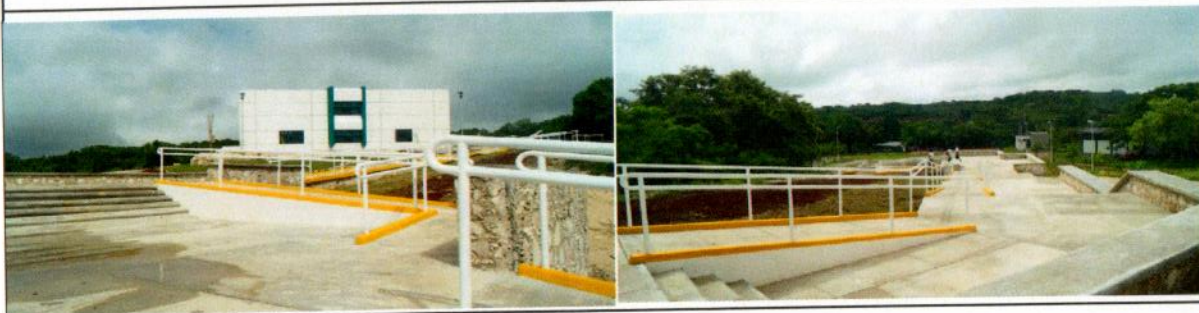

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Unidad Académica Departamental Tipo I, Escaleras, Barandales, Rampas y Acceso a la Unidad (Finalizado)



S E P
T. N. M

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE CHINA
CLAVE:
04DIT0002W



Aulas, Baños y Cubiculos y Oficinas d la Unidad Académica Departamental Tipo I (Finalizado)



2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

Núm. Oficio: **INIFEEC/CA/095/2019**
Asunto: **Tarjeta Informativa**

MGTI. Elías de Jesús Echeverría Góngora
Subdirector de Planeación y Vinculación
del Instituto Tecnológico de China
Calle 11 s/n entre 22 y 28,
C.P. 24520, Campeche, China

At'n.- Lic. Carlos Alejandro Tzec Pool
Subdirector de Servicios Administrativos
del Instituto Tecnológico de China

PRESENTE.

San Francisco de Campeche, Camp., a 09 de mayo de 2019

Con la presente, de manera respetuosa y atenta, le informo el siguiente reporte del Recurso PROEXE 2014, y 2015; de los intereses generados y el saldo, que a continuación se relacionan:

TARJETA INFORMATIVA PROEXE TECNOLOGICO DE CHINA 2014

TOTAL INGRESOS		
MINISTRACION	8,500,000.00	
INTERESES GENERADOS 2014-2018	12,462.40	8,512,462.40
TOTAL EGRESOS		
INFRAESTRUCTURA	7,883,739.53	
EQUIPAMIENTO	493,411.21	
RETENCIONES	133,883.66	8,511,034.40
SALDO REINTEGRADO A LA TESOFE EL 27/07/2018		1,428.00

LA CUENTA YA HA SIDO CANCELADA.

TARJETA INFORMATIVA PROEXE TECNOLOGICO DE CHINA 2015

TOTAL INGRESOS		
MINISTRACION	8,499,999.99	
INTERESES GENERADOS 2014-2018	498.97	8,500,498.96
TOTAL EGRESOS		
INFRAESTRUCTURA	6,464,890.45	
EQUIPAMIENTO	1,922,772.48	
RETENCIONES	112,388.03	8,500,050.96
SALDO REINTEGRADO A LA TESOFE EL 25/09/2018		448.00

LA CUENTA YA HA SIDO CANCELADA.


EN RELACION AL SALDO DE 5,440.67

INGRESO MINISTRADO EL 14/12/2016		5,440.67
ESTIMACION UNICA INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA, CAMPECHE, INIFEEC-OP-153-2016 PAGADA EL 26/01/2017	\$5,360.94	
RETENCIONES	\$79.73	\$5,440.67
SE EJERCIO TOTALMENTE		\$0.00

Nota: Se envía Elemento en medio magnético en formato .PDF, que contiene la Tarjeta Informativa, a los siguientes correos electrónicos: carlos_tzec@hotmail.com y plan-china@tecm.mx

Sin otro particular y agradeciendo su atención, reciba un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente



Lic. José Roberto Gómez López
Coordinador Administrativo

C.c.p.-Arq. Rossina Isabel Saravia Lugo.-Director General
C.c.p.-Ing. Luis Candelario Contreras Segovia.-Director de Planeación, Programación y Presupuesto
