

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

**DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ  
 DOMICILIO COMPLETO CALLE 11 S/N ENTRE 22 Y 28 CHINÁ CAMPECHE C.P. 24520

**CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA**

FECHA DE INICIO 

23	3	2015
DÍA	MES	AÑO

  
 FECHA DE TERMINACIÓN 

19	8	2016
DÍA	MES	AÑO

**FECHA DEL REPORTE**

FECHA 

9	9	2019
DÍA	MES	AÑO

**2019  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE  
MÉXICO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN,  
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA.  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y  
MANTENIMIENTO.

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media y Superior 2015 (ProExOEEES 2015)	Construcción de la 2da. Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo I	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	100%	8,500,000.00	1,087	1,214	100%	Se anexa Tarjeta Informativa enviada con oficio No. INIFEEC/CA/095/2019 por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC) con el Desglose de los Recursos recibidos, ejecutados y devueltos a la TESOFE - ProExOEEES 2014 y 2015 - INIFEEC

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

NOMBRE : MDE. MARÍA ESTHER COHUJO ÁVILA  
 CARGO : JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
 CORREO ELECTRONICO : pl\_china@tecnm.mx / pameitchina@gmail.com  
 TEL 10 DÍGITOS : 9961020051

FIRMA



NOMBRE :

MC. JOSÉ JAVIER PERALTA COSGAYA

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA



SELLO OFICIAL



**S.E.P.  
T.N.M.  
INSTITUTO  
TECNOLÓGICO  
DE CHINA  
CLAVE:  
04DIT0002W**

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO**

**EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO**

FAM ( FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ( VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)  
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)  
OTROS (ESPECIFICAR)

**DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.**

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)


2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Edificio de Unidad Académica Departamental Tipo I, Vista de Frente Panorámico (Finalizado y Puesta a Punto)

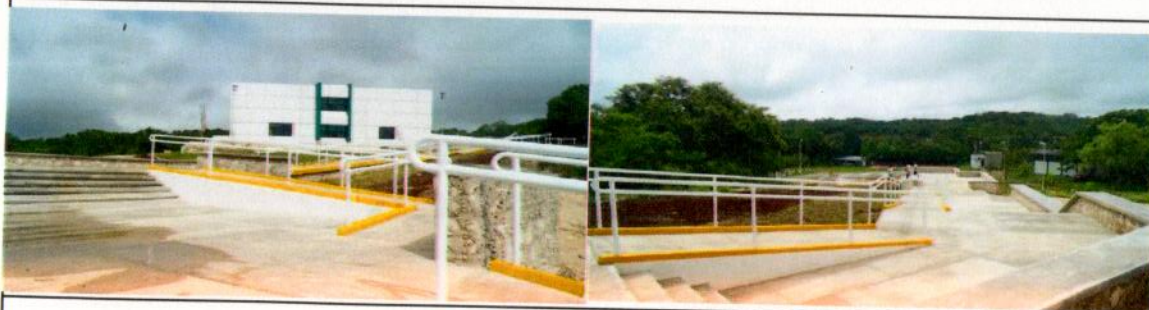

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Unidad Académica Departamental Tipo I, Escaleras, Barandales, Rampas y Acceso a la Unidad (Finalizado)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Aulas, Baños y Cubiculos y Oficinas d la Uidad Académica Departamental Tipo I (Finalizado)

S.E.P.  
T.N.M.  
INSTITUTO  
TECNOLÓGICO  
DE CHINA  
CLAVE:  
04DIT9002W





2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

Núm. Oficio: **INIFEEC/CA/095/2019**  
Asunto: **Tarjeta Informativa**

**MGTI. Elías de Jesús Echeverría Góngora**  
Subdirector de Planeación y Vinculación  
del Instituto Tecnológico de China  
Calle 11 s/n entre 22 y 28,  
C.P. 24520, Campeche, China

At'n.- **Lic. Carlos Alejandro Tzec Pool**  
Subdirector de Servicios Administrativos  
del Instituto Tecnológico de China

PRESENTE.

San Francisco de Campeche, Camp., a 09 de mayo de 2019

Con la presente, de manera respetuosa y atenta, le informo el siguiente reporte del Recurso PROEXE 2014, y 2015; de los intereses generados y el saldo, que a continuación se relacionan:

**TARJETA INFORMATIVA PROEXE TECNOLÓGICO DE CHINA 2014**

TOTAL INGRESOS		
MINISTRACION	8,500,000.00	
INTERESES GENERADOS 2014-2018	12,462.40	8,512,462.40
TOTAL EGRESOS		
INFRAESTRUCTURA	7,803,739.53	
EQUIPAMIENTO	493,411.21	
RETENCIONES	133,863.66	8,511,034.40
SALDO REINTEGRADO A LA TESOFE EL 27/07/2016		1,428.00

LA CUENTA YA HA SIDO CANCELADA.

**TARJETA INFORMATIVA PROEXE TECNOLÓGICO DE CHINA 2015**

TOTAL INGRESOS		
MINISTRACION	8,499,999.99	
INTERESES GENERADOS 2014-2018	492.97	8,500,496.96
TOTAL EGRESOS		
INFRAESTRUCTURA	6,404,890.45	
EQUIPAMIENTO	1,922,772.48	
RETENCIONES	112,388.03	8,500,050.96
SALDO REINTEGRADO A LA TESOFE EL 25/05/2018		448.00


LA CUENTA YA HA SIDO CANCELADA.

EN RELACION AL SALDO DE 5,440.57		
INGRESO MINISTRADO EL 14/12/2016		5,440.57
ESTIMACIÓN UNICA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA, CAMPECHE. INIFEEC-OP-153-2016 PAGADA EL 20/01/2017	55,380.24	
RETENCIONES	879.73	55,440.57
SE EJERCIO TOTALMENTE		50.00

Nota: Se envía Elemento en medio magnético en formato .PDF, que contiene la Tarjeta Informativa, a los siguientes correos electrónicos: [carlos\\_tzec@hotmail.com](mailto:carlos_tzec@hotmail.com) y [plan-china@tec.mx](mailto:plan-china@tec.mx)

Sin otro particular y agradeciendo su atención, reciba un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

  
**Lic. José Roberto Gómez López**  
Coordinador Administrativo

C.c.p.-Arq. Rossina Isabel Saravia Lugo.-Director General  
C.c.p.-Ing. Luis Candelario Contreras Segovia.-Director de Planeación, Programación y Presupuesto



**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)**  
Calle 7 S/N x Av. Juan de la Barrera Col. FCVI "Héroes de Chapultepec"  
24030 San Francisco de Campeche, Campeche  
Teléfono y Fax: (981) 816-3750, 816-4972 y 811-2928  
e-mail: [sistemas@inifeec.gob.mx](mailto:sistemas@inifeec.gob.mx)  
[directorgeneral@inifeec.gob.mx](mailto:directorgeneral@inifeec.gob.mx)

